

Predicción de Ausentismo y Rotación del Personal Operativo

plazaVea & Vivanda

PROJECT CHARTER & GOVERNANCE

Versión 1.0

Estado: Draft

CONTROL DEL DOCUMENTO

Proyecto	People Analytics – Ausentismo y Rotación
Cliente	Supermercados Peruanos S.A.
Marcas	plazaVea / Vivanda
Área solicitante	Operaciones
Área ejecutora	Business Analytics
Soporte técnico	Data Platform
Fecha	Junio 2026
Estado	DRAFT

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	AUTOR
1.0	Jun-2026	Business Analytics
Cambios: versión inicial del documento.		

TABLA DE CONTENIDO

01	Introducción	10	Matriz RACI
02	Antecedentes	11	Casos de Uso
03	Problemática del Negocio	12	KPIs del Proyecto
04	Justificación	13	Riesgos
05	Objetivos	14	Dependencias
06	Beneficios Esperados	15	Entregables
07	Alcance	16	Roadmap Ejecutivo
08	Stakeholders	17	Factores Críticos de Éxito
09	Gobierno del Proyecto	18	Próximos Pasos

01 Introducción

1.1 Contexto

Durante los últimos meses, Supermercados Peruanos ha identificado un incremento sostenido en los niveles de rotación del personal operativo, particularmente en las tiendas **Plaza Vea** y **Vivanda**.

Esta situación impacta directamente sobre:

Cobertura operativa

Productividad

Calidad del servicio

Costos de contratación

Costos de capacitación

Curva de aprendizaje

Experiencia del cliente

Paralelamente, existe la necesidad de comprender mejor los factores que originan el ausentismo y la rotación, con el objetivo de anticipar estos eventos y permitir la implementación de acciones preventivas.

En respuesta a esta necesidad, **Business Analytics** propone el desarrollo de una solución integral de **People Analytics** basada en analítica avanzada y modelos predictivos que permitan comprender, predecir y gestionar los riesgos asociados a la permanencia del talento operativo.

02 Antecedentes

Actualmente la planificación operativa considera indicadores históricos de rotación y cobertura como insumos para la gestión de dotación de personal. Sin embargo, el proceso presenta limitaciones importantes:

- El análisis es principalmente descriptivo.
- No existe capacidad predictiva.
- No se identifican oportunamente los colaboradores con alto riesgo de rotación.
- No existe una caracterización objetiva del perfil óptimo de permanencia.
- La información se encuentra distribuida en múltiples plataformas (SharePoint, Kronos, Azure, reportes BI, entre otros).
- No existe una vista integrada que permita analizar simultáneamente variables operativas, laborales y demográficas.

Como consecuencia, las decisiones relacionadas con contratación, asignación y gestión del personal dependen en gran medida de criterios operativos e hipótesis no validadas analíticamente.

03 Problemática del Negocio

A partir de las sesiones iniciales de descubrimiento con Operaciones se identificaron los siguientes desafíos estratégicos.

3.1 Incremento de la rotación

Las tiendas presentan un incremento sostenido de colaboradores que abandonan la organización durante sus primeros meses de permanencia. Ello genera:

Incremento del costo de reclutamiento

Incremento del costo de capacitación

Pérdida de productividad

Mayor presión sobre los equipos existentes

Reducción en la calidad del servicio

3.2 Alta rotación temprana

Se observa una proporción importante de colaboradores que abandonan la organización durante los primeros **tres a seis meses**. Esto limita la consolidación de experiencia operativa y afecta la estabilidad de las tiendas.

3.3 Dificultad para anticipar necesidades

Actualmente no existe un mecanismo que permita anticipar:

- Futuras renunciaciones.
- Incremento del ausentismo.
- Deterioro de indicadores de cobertura.

3.4 Desconocimiento del perfil óptimo

Existen múltiples hipótesis relacionadas con variables como:

Edad

Condición de estudiante

Distancia hogar-tienda

Liderazgo

Horarios

Horas extras

Sin embargo, dichas hipótesis no han sido validadas mediante evidencia analítica.

04 Justificación del Proyecto

La implementación de una plataforma de People Analytics permitirá evolucionar desde un esquema **reactivo** hacia un modelo de gestión **basado en evidencia**. Los principales beneficios esperados incluyen:

Identificación temprana de riesgos

Optimización de procesos de selección

Mejora en la planificación de dotación

Reducción de costos asociados a rotación

Mejora de la productividad

Incremento de la estabilidad operativa

05 Objetivos

5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una solución integral de analítica avanzada que permita **comprender, predecir y gestionar** el riesgo de rotación y ausentismo del personal operativo de plazaVea y Vivanda, proporcionando herramientas para mejorar la toma de decisiones relacionadas con contratación, permanencia y gestión del talento.

5.2 Objetivos Específicos

1 Identificar los principales factores que explican la rotación y el ausentismo.

2 Caracterizar el perfil óptimo de permanencia.

3 Construir modelos predictivos de riesgo.

4 Diseñar mecanismos de alertamiento temprano.

5 Implementar dashboards ejecutivos.

6 Facilitar la toma de decisiones basada en datos.

06 Beneficios Esperados

Estratégicos

- Mayor estabilidad operativa.
- Mejora en cobertura.
- Mejor planificación.
- Mayor productividad.
- Reducción del costo operativo.

Analíticos

- Visión integrada del colaborador.
- Identificación de variables críticas.
- Modelos interpretables.
- Explicabilidad mediante IA.

Operativos

- Mejor asignación de personal.
- Reducción de vacantes.
- Menor tiempo de reemplazo.
- Mayor continuidad operativa.

07 Alcance

✓ Incluye

- ✓ plazaVea
- ✓ Vivanda
- ✓ Personal operativo
- ✓ Análisis histórico
- ✓ Integración de múltiples fuentes
- ✓ Modelos predictivos
- ✓ Dashboard ejecutivo
- ✓ Transferencia de conocimiento

✗ No incluye (versión inicial)

- ✗ Personal administrativo
- ✗ Makro
- ✗ Automatización del proceso de reclutamiento

08 Stakeholders

ÁREA	PARTICIPACIÓN
Operaciones	Sponsor funcional
Gestión Humana	Dueño funcional de RRHH
Business Analytics	Desarrollo analítico
Data Platform	Integración e ingeniería de datos
BI	Explotación y visualización
Tiendas	Validación operativa

09 Gobierno del Proyecto

Se propone un modelo de gobernanza basado en **tres niveles**.

NIVEL ESTRATÉGICO Comité Ejecutivo	NIVEL TÁCTICO Comité Operativo	NIVEL TÉCNICO Sesiones de Trabajo
QUINCENAL	SEMANAL	SEGÚN NECESIDAD
- Revisión de avances. - Toma de decisiones. - Gestión de riesgos.	- Seguimiento técnico. - Validación funcional. - Definición de prioridades.	Participantes: Business Analytics Data Platform RRHH

10

Matriz RACI (Inicial)

R

Responsable

A

Aprobador

C

Consultado

I

Informado

ACTIVIDAD	OPERACIONES	GH	BA	DATA PLATFORM
Definición de alcance	A	C	R	I
Fuentes de datos	C	R	C	A
Integración	I	I	C	R
Modelado	C	C	R	C
Dashboard	C	I	R	C
Validación	R	C	A	I

11

Casos de Uso

01 Perfilamiento para contratación	02 Predicción de riesgo individual	03 Predicción de riesgo por tienda	04 Alertamiento temprano	05 Monitoreo ejecutivo
---	---	---	-------------------------------------	-----------------------------------

12 KPIs del Proyecto

KPIS DE NEGOCIO

Rotación mensual

Rotación temprana

Ausentismo

Cobertura

Productividad

NPS

KPIS DE PROYECTO

Disponibilidad de fuentes

Calidad de datos

Cobertura de variables

Tiempo de actualización

13 Riesgos

RIESGO	IMPACTO	MITIGACIÓN
Fuentes no disponibles	ALTO	Data Readiness
Información incompleta	ALTO	Data Profiling
Dependencia de SharePoint	MEDIO	Migración a GCP
Demoras en la integración	ALTO	Involucrar a Data Platform desde el inicio
Cambios de alcance	MEDIO	Control de requerimientos

14 Dependencias

Operaciones

- Validación funcional.

RRHH

- Disponibilidad de fuentes.

Data Platform

- Construcción de pipelines.
- Disponibilización de datos.
- Gobierno de datos.

Business Analytics

- Diseño metodológico.
- Modelado.
- Dashboard.

15 Entregables

01 Inventario de fuentes

02 Arquitectura de datos

03 Diagnóstico analítico

04 Perfil óptimo

05 Modelo predictivo de rotación

06 Modelo predictivo de ausentismo


07 Dashboard ejecutivo

08 Generación de alertas

09 Documentación técnica

10 Transferencia de conocimiento

16 Roadmap Ejecutivo

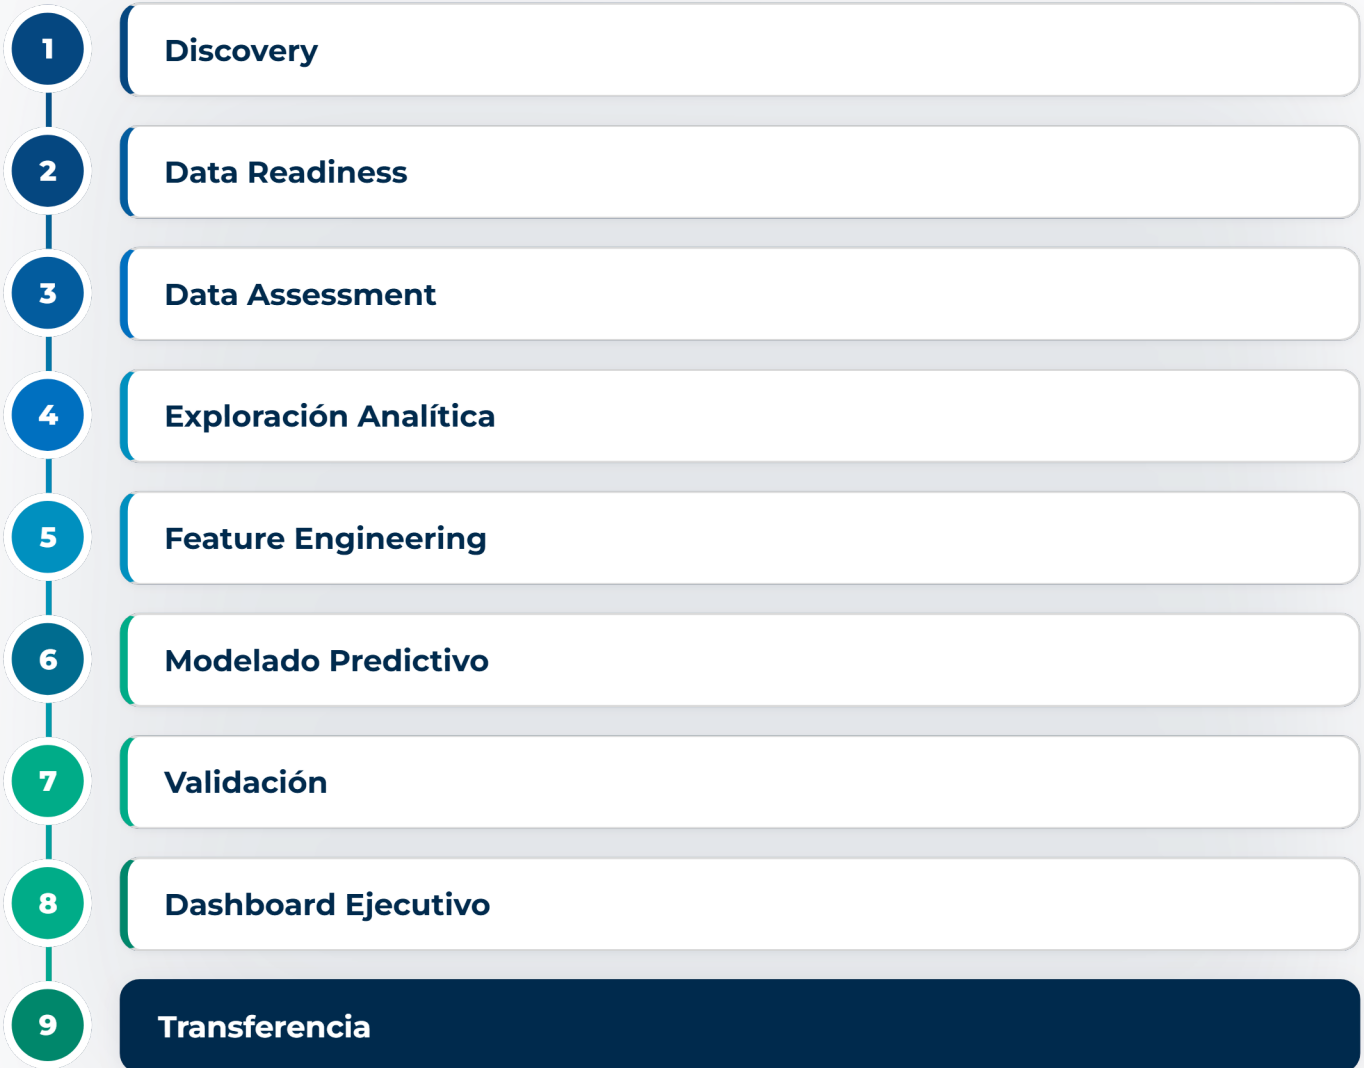

17 Factores Críticos de Éxito

El éxito del proyecto dependerá principalmente de:

✓ Disponibilidad oportuna de las fuentes de información.

✓ Participación activa de Operaciones y Gestión Humana.

- ✓ Involucramiento temprano del equipo de Data Platform para la integración y disponibilización de datos en GCP.
- ✓ Calidad y completitud de la información histórica.
- ✓ Validación continua de hipótesis de negocio con evidencia analítica.
- ✓ Adopción de los modelos y dashboards por parte de los usuarios finales.

18 Próximos Pasos

Fase Inmediata

2 SEMANAS

- 1 Validación del alcance con los sponsors.
- 2 Consolidación del inventario de fuentes de datos.
- 3 Identificación de data owners por fuente.
- 4 Evaluación del estado de disponibilidad en GCP.
- 5 Definición del plan de Data Readiness con Data Platform.
- 6 Aprobación de la metodología del proyecto.
- 7 Realización del Kick-off oficial.
